

课题三 · AI 赋能游戏项目管理

《英雄联盟手游》7.1 「全速竞逐」版本 项目管理实战

快速接手 · 冲刺管理 · 复盘规划

进度 · 风险 · 舆情，一屏收敛，支撑早预警 · 早决策

说明：本作业以《英雄联盟手游》7.1「全速竞逐」**真实版本**为项目认知蓝本；团队规模（60 人）、人力 / 需求 / 范围三项冲刺期冲突等**团队场景**为课题设定的**虚构情境**。全程借助 AI 工具（Claude）放大信息梳理、框架搭建与方案模拟，事实结论经一手核验或双源交叉，**与 AI 交互的关键过程记录见第一部分附录**。

莫心雅 · Cynthia Mo

提交物：项目认知地图 · 上手 SOP · 冲突决策 · 复盘规划 · 在线风险看板（加分项）

目录

导读：本案沿「快速接手 → 冲刺管理 → 复盘规划」的全链路展开。第一部分用一张认知地图与一套 48 小时上手 SOP 完成项目认知构建（含与 AI 交互过程记录）；第二部分给出冲刺期人力 / 需求 / 范围三冲突的处置方案；第三部分沉淀复盘框架与未来三个月 Roadmap。

第一部分 · 快速接手 · 项目认知构建

- ▶ 项目认知地图
- ▶ 新人 PM 48 小时上手 SOP

第二部分 · 冲刺管理 · 冲突决策与团队协作

- ▶ 冲突决策与团队协作
- ▶ 需求变更评估会 · 会议纪要

第三部分 · 复盘规划

- ▶ 版本复盘框架
- ▶ 未来三个月版本 Roadmap
- ▶ 开放题：PM 与制作人
- ▶ 附 · 与 AI 工具交互的关键过程记录

第一部分

快速接手·项目认知构建

Part①-A 项目认知地图

情境：新任PM加入已运营半年的60人MOBA项目组（品类蓝本：《英雄联盟手游》7.1"全速竞逐"版本），版本更新在即，需在最短时间内搞清楚三个问题——**这个项目在做什么、为谁做、对手是谁。**

本地图四块对应回答：做什么=块1（玩法）+块4（版本现状）；为谁做=块2（用户）；对手是谁=块3（竞品，下文统称市场龙头王者荣耀）。

块1 · 核心玩法拆解 —— 它在做一款什么游戏

品类骨架：MOBA的本质是**对称起点的零和团队竞技**——双方资源镜像、信息部分公开、摧毁对方基地是唯一胜利条件，竞技深度来自"英雄组合×资源运营×时机决策"三轴。本品在品类光谱中的位置：比同类竞品更保留端游的操作上限与资源博弈（补刀经济、视野、中立资源），同时为移动端做了三刀减法——**地图缩小**（含BP整局约19-22分钟）、**补刀简化**（降低基本功门槛）、**无铭文系统**（天赋统一起跑线，既是新手友好设计，也是玩家公认的公平性卖点）。操作底盘为双摇杆（移动+技能瞄准），保留"技能命中"的上限空间。

核心循环（双层互锁）： - **局内循环**（含BP约19-22分钟）：BP选人（策略博弈）→ 对线发育（个人基本功）→ 中期资源团（小龙/先锋/男爵，团队协作的转折点）→ 团战推塔 → 结算。 - **局外元循环**（一个赛季约3个月）：赛季是节拍器——段位软重置、新赛季皮肤与峡谷宝典上线，给玩家一个"重新冲"的理由；而英雄熟练度与皮肤收藏是只增不减的留存资产，越攒越舍不得走。一边靠周期性"重来"拉回归，一边靠持续"积累"沉淀粘性。局内表现喂养局外成长（英雄分、星核、战利品），局外目标拉动局内参与（段位追求、收集欲、赛季限定），**局内外双循环互锁，构成留存发动机**。商业线挂在元循环上：免费传说皮肤获取线=口碑护城河，臻藏品皮肤线=付费深水区。

竞技阶梯（严肃度·门槛·荣誉感逐级递增）：**匹配**（练习层）→ **排位**（主轴是段位进阶与公平竞技；严肃度随段位递增，禁用位解锁即一例——黄金及以下无，铂金~钻石各3，大师及以上各5，组队按队内最高段位计）→ **峡谷之巅**（权威层：超凡大师III门槛、仅单排、全程代号匿名、星核反哺排位、为国服塔尖玩家颁发实体勋章的荣誉运营）。

娱乐模式：常驻保日常、限时造峰值：常驻场（符文大乱斗7.1起以赛车主题转常驻、极地大乱斗、人机）托住日常；限时场按热度轮换（无限火力、克隆大作战等开黑爽局），常态停服蓄势、返场即峰值。号召力来自爽感密度（无蓝耗、极短CD）、规则颠覆的新鲜感、低胜负压力的开黑属性与稀缺造就的全年期待——"返场就拉人回坑"，唤回的是一群人。

版本节奏六层：大版本（约一季一更：常态上新英雄；符文大规模革新、引擎全面升级仅极少数重磅版本才有、不随每季同步）→ **字母补丁**（7.1a/c/d，约1-2周一个，承担平衡性与模式调优）→ **商业线**（IP联名常态

化：当期保时捷联动“星速竞逐”系列、随后NBA中国联动，声量与付费双峰）→ **内容线**（风驰系列皮肤连发；值得注意的是，手游并非单纯搬运端游资产——大量新英雄、新皮肤为手游独有，“手游首发”是官方推文的常态标签，端游IP资产与手游原创管线构成内容双供给，这也是块3美术判断的产能基础）→ **节日线**（喵了咪三重设计：视觉猫化+语音喵化+表情包）→ **电竞线**（双线导流：端游LPL/S赛热度反哺，手游自有WRL职业联赛、高校赛与艾欧尼亚杯等同步宣发，游戏内直推手游赛事直播）。六层并行而不撞期，是块4“节奏健康度”的内容侧来源。

块2 · 目标用户画像 —— 它为谁做

三类主力（搜索词条实锤，各有清晰的诉求—痛点—供给链条）：

人群	搜索词证据	核心诉求	主要痛点	产品对应供给
情怀党 (端游迁移)	"和端游区别""双端互通"	IP还原度、情怀延续、跨端资产	手游简化损失"原汁原味"	联盟IP宇宙、S赛/LPL电竞线、端游联动
竞技党	"英雄强度排行""段位"	平衡性、匹配公平、段位含金量	ELO匹配争议（见块4）	排位+峡谷之巅权威层、赛季奖励
社交党	"搭子""加好友"	开黑体验、低压力同乐	单排环境波动	常驻娱乐+限时开黑场、公会系统（公会对决·同会开黑加成）、密友系统、双平台组队互通、盟友圈内容社区（找搭子·同人·创作者生态）

人群×模式映射（与块1的咬合）：竞技党主驻排位与峡谷之巅；社交党主驻常驻娱乐与限时轮换；情怀党全域分布、由IP内容（皮肤、电竞、联动）唤回。**轮换模式是三群的交集**——竞技党的放松场、社交党的开黑场、情怀党的回坑入口，这解释了它作为运营王牌的战略价值。

新手暗流：新手类词条量大，且有从竞品转来的资深玩家直言“基础不理解”——劝退漏斗真实存在。官方已给出针对性入口设计：开局身份二选一，新手走完整引导、有MOBA经验者教程大幅精简并可一键跳过，为“端游老玩家迁移”这一主力人群量身定制。但身份选择只解决“不耐烦”，没解决“看了视频仍不理解”的认知门槛——下载→教学完成→首胜→第10局留存的漏斗，每一级流失依然真实，与“核心玩家认可、新手劝退”的口碑分化互文。

人群结构特征：年龄偏成熟（端游迁移而来，叠加行业背景——35.6%的MOBA玩家游龄5年以上）；活跃时段为晚间+周末（官方活动UP时段反推：工作日19-24点+周末黄金档，即学生与上班族碎片时间后的整块时段）。

7.1版本优先服务谁=双轨并行：这个版本同时推进两条线——**高付费线**（保时捷“星速竞逐”系列，臻藏品质硬保底折算千元级、全系列收集数千元，经媒体估算与游戏内定价双源校准）冲营收；**高DAU线**（喵了咪低门槛+全直售限免）保大盘活跃。一个版本里“既要营收冲刺、又要大盘保温”，就是它给出的运营答卷。

块3 · 竞品格局分析 —— 它的对手是谁

体量现实：竞品国服DAU约1.39亿、全球MAU约2.6亿；本品日均收入约454万。后发困境一句玩家原话讲透："肯德基都吃饱了，你汉堡王来了。"两品玩家的身份对立是真实的社区结构——开服期的"凉凉文学"系列嘲讽至今仍是梗，这场舆论叙事战长期存在。

三件差异化武器（产品力与IP资产，非体量优势）：
 - **玩法机制深度**：保留端游的资源运营（补刀经济、视野、中立资源）与操作上限，单局体量更大、战术更复杂，竞技深度对标端游LPL——这是产品力的本质差异，也是硬核玩家口中"上限比竞品高"的根。
 - **背靠LOL端游IP**：IP热度、全球电竞赛事（S赛/LPL）热度与丰富世界观，为后发拉新提供事件级引擎——存量深水市场拉新靠IP事件而非买量。
 - **美术多样性**：联盟IP的角色设计在物种、体型、年龄、性格与审美取向上具备世界观级的丰富度——角色形象（尤其女性角色）多元、不拘于单一审美模板；相较之下竞品的角色设计更趋同单一。这种多样性买量买不来、竞品难复制，是内容层面的差异化资产。

市场盘子：2025中国MOBA手游约417.5亿元、同比+10.2%；35.6%玩家游龄5年以上=存量深水市场，拉新靠IP事件而非买量。

战略主线（题眼）：

「竞品赢在全民流量与福利厚度，我们赢在机制深度、端游IP与美术多样性——不拼体量，错位服务从端游走来的硬核玩家。」

用法=所有两难决策的裁判尺：保时捷该不该做、喵了咪该不该做、匹配机制该不该优先修，拿它一照就知道偏向谁。

块4 · 当前版本核心指标 —— 它现在的健康度

外部可证信号（48h无内部权限时的摸底，按**横向—纵向—结构**三维定位口碑）：

- **横向（与竞品同平台比）**：虎扑8.1分但61.5%五星／15.5%一星、抖音7.5——两极分化为真；同平台基准下，头部MOBA差评底噪是品类共性（竞品TapTap长期4.8-5.0，本品约6.4），总量不离群。一处值得注意的圈层反差：同在虎扑，竞品仅2.8分（36.4万评分）而本品8.1——但虎扑是端游/硬核倾向社区，这一反差更多反映**圈层立场**（硬核社区认本品、对大众向竞品恶评）而非客观质量，恰好印证两品的圈层错位。
- **纵向（与自身历史比，评价区按"最早/最晚"排序做时间切片：2023.12开服期 vs 2025.08-2026.03近期，935条样本）**：开服期偏正面、以"比王者好"为基调（最高赞877）；近期显著转负，ELO／匹配机制成为差评主轴；"比王者"参照系从真心夸赞退化为反讽——玩家心态由"超越王者"滑向"别变成王者"。
- **结构（差评是分散还是集中）**：差评并非均匀分散的底噪，而是高度收敛于两簇——**ELO／匹配机制**为压倒性主簇，**举报／监管判定不透明**（"举报没用"与"封号误伤"双向不满并存）为次簇。分散是底噪，集中是信号——集中点就是可点名的问题。
- **两个数据陷阱（方法论发现）**：①高赞≠主流情绪——评价区点赞最高的内容恰是反讽差评者的神回复，单看赞数会得出与逐条阅读相反的结论；②ELO质疑自开服第2天即已出现——端游社区话术惯性随玩家迁移而来，体验归因时需区分"真实机制问题"与"社区话术惯性"。

- **声量权重**（公众号阅读）：大IP联动10万+ > 热门英雄皮肤5万+ > 节日活动3.7万 > 常规公告1-3万。
- **节奏健康度**：公众号近乎日更、多活动并行不撞期。

内部报表清单【推演】：DAU/MAU、次留/7留/30留、付费率/ARPPU、赛季任务参与率、新手漏斗（教学完成率→首胜→第10局留存）、模式参与分布、举报/挂机率、舆情周报+客服工单分类、**匹配/ELO满意度专项归因**（设计上区分真实机制缺陷与社区话术惯性）。

健康度初判：总量正常（横向基准内）；"匹配体验"纵向证实为持续恶化趋势、结构上为最大收敛簇——列为风险看板**重点观察项（黄色）**，暂不拉警报（缓冲依据：ELO话术惯性自开服伴随、高赞反讽显示社区主流情绪与差评区存在偏差）；监管／举报判定透明度列为第二观察项。

Part①-B 新人PM 48小时上手SOP

定位：本SOP与《项目认知地图》互为表里——地图是这48小时的**产出物**，SOP是产出过程的**方法论化**。每个环节标注AI任务与对应产出的地图模块，完整覆盖**信息收集、文档梳理、关键人物与利益相关方梳理**三类任务；照此SOP，新人PM也可在其他成熟项目复刻出一张自己的认知地图。

H0-4 · 进游戏，先当玩家

- **目标**：建立不可外包的一手体感——后续一切二手信息都要拿它来校准。
- **动作：双账号并行**。新账号选"我是新手"身份从头体验：完整新手引导、首批对局、各功能的解锁节奏——每道门槛出现的位置（等级、英雄数、段位要求）本身就是新手漏斗的一手数据。成熟账号（借用资深玩家账号或申请公司测试账号）体验新号短期内到不了的后期链路：排位禁用规则、峡谷之巅规则与排行榜、星速竞速抽卡与定价页、充值档位、活动中心全貌（本期喵了咪、星速竞速、战斗学院、LPL赛段四活动并行）。全程截图，爽点与卡点各记3条。
- **AI任务**：无——一手体验不可外包。截图按"模式／商业／活动／社交"四类归档，供后续环节的AI消化使用。
- **产出→地图去向**：模式结构与商业链的一手底账（块1）；新手引导设计观察与解锁门槛记录（块2新手暗流）；抽卡定价一手证据（块2付费深水区）；多活动并行实况（块4节奏健康度）。
- **避坑**：别试图用一个新号在4小时里看完全貌——排位与峡谷之巅都有硬门槛，新号到不了是常态，这正是双账号的原因；新手引导本身的产品设计（身份二选一、强制段仅1分钟、跳过的奖励可补领）也是观察对象，不只是一段要跳过的流程。

H4-10 · 内部文档梳理【推演】

- **目标**：把团队已有的纸面共识吃进来——新人最快的起点不是问人，是读已经写下来的东西。
- **动作**：向直属上级索取四类文档——①7.1版本计划与排期表 ②S21赛季与符文革新设计文档 ③上一版本复盘 ④风险登记册（核对"匹配舆情"是否已在册）。

- **AI任务**：长文档喂AI做三件事——按"目标／范围／未决项"做结构化摘要；**跨文档找矛盾点**（排期与资源是否打架、上版复盘承诺的改进是否进了7.1计划）；生成"我该问谁什么"的问题清单，直接喂给H22的访谈环节。所有数字与结论由人工核对出处。
- **产出 → 地图去向**：一页"纸面现状"摘要＋矛盾点清单（块4内部报表清单的口径来源；版本冲突的纸面预兆）。
- **避坑**：文档≠现实——所有纸面结论标注"待访谈验证"；矛盾点不是用来质问谁的，是用来定位访谈重点的。

H10-16 · 外部口碑摸底（信息收集）

- **目标**：玩家嘴里的产品长什么样——和纸面现状做第一次对撞。
- **动作**：评分平台**横向**对比（虎扑／TapTap／抖音，与竞品同平台基准互参）；**纵向**时间切片（评价区按"最早/最晚"排序，对比开服期与近期的差评主题迁移）；**结构**归簇（差评收敛在哪几个点上）；搜索词条画像；UGC热度盘点。
- **AI任务**：图片素材经**专用"消化对话"**转成文字档案再进主流程（隔离上下文成本，主对话只读浓缩档案）；AI聚合归类玩家原话、标注高频主题与日期；人工抽查原图，防转述失真。
- **产出 → 地图去向**：横向—纵向—结构三维口碑定位与差评双簇（块4）；三类用户搜索词画像（块2）。
- **避坑**：高赞≠主流情绪；同一句评价在不同时期含义可能反转（真心夸 vs 反讽），不能跨时期当同义证据。

H16-22 · 官方信息考古（信息收集）

- **目标**：官方在把资源压向哪里——动作比口号诚实。
- **动作**：公众号近两月推文时间线＋7.1版本专题全收；把阅读量当注意力权重的代理指标做声量排序（本项目实测：大IP联动10万+ > 热门英雄皮肤5万+ > 节日活动3.7万 > 常规公告1-3万）；对照游戏内活动中心核验排期。
- **AI任务**：AI做时间线结构化与声量排序；人做权重判断与异常点解读。
- **产出 → 地图去向**：版本节奏六层（块1）；声量权重排序（块4，亦是后续需求争议类决策的弹药）。
- **避坑**：阅读量是代理指标不是KPI本体，只做相对比较；官宣口径与游戏内不一致时，**以游戏内一手为准**（本项目实例：活动截止日官宣写5/31、游戏内显示6/8，取后者）。

H22-30 · 干系人梳理与关键访谈（关键人物与利益相关方梳理）【推演】

- **目标**：搞清"谁影响这个版本的成败、各自要什么"——先画地图，再去敲门。
- **动作**：1. **画干系人地图**：列出60人项目组的关键角色——制作人、主策划、主程序、美术负责人、数据分析、QA负责人、运营、市场与发行接口，按"影响力×利益相关度"两轴排布，逐人标注其7.1版本诉求与张力点（如：运营背臻藏流水目标 vs 主策划背赛季体验口碑；QA的质量门槛 vs 版本上线窗口），素材直接取自H4-10的矛盾点清单；2. **借直属上级引荐，约关键角色做简短交流**：由上级帮忙牵线，优先约到协作最紧密的主策划/主程/数据分析（15-30分钟、能约到几场算几场）；制作人等高层多为简短照面或排到第一

周，不强求48小时内深聊。话题各有侧重——主策划问S21符文革新的目标指标、数据分析问新手漏斗与匹配满意度的报表口径、QA问7.1风险TOP3、有机会再向制作人请教双轨的真实优先级。

- **AI任务**：AI据H4-10的矛盾点清单与角色列表，生成干系人矩阵（影响力×利益相关度）初稿与各角色诉求标注，人来校正取舍；AI按角色生成访谈提纲初稿与追问树，人主导现场追问与临场判断；访谈纪要回喂AI做**跨人口径比对**——不同角色对同一件事的说法打架处，就是真风险所在。
- **产出 → 地图去向**：一页干系人地图（两轴矩阵+诉求标注）+已完成场次的访谈纪要+口径冲突清单（本期冲突决策的依据底座——人力、需求、范围三类冲突多半在此首次露头）。
- **避坑**：新人入职48小时内约齐四位关键角色是小概率事件——本时段的**硬交付是干系人地图与问题清单**，访谈完成几场算几场，未竟场次列入第一周计划；先地图后约人，否则问错人浪费宝贵的30分钟配额；姿态是“请教+核对”，不是“质询”。

H30-40 · 交叉验证与考证

- **目标**：把“听说”升级成“可证”——地图上每一条都要经得起追问“你怎么知道的”。
- **动作**：逐条找反证——臻藏付费深度用“媒体估算+游戏内定价页”双源校准（支撑块2高付费线结论）；一星占比用“横向竞品基准+纵向自身趋势+结构归簇”三维定位（支撑块4健康度初判）；纸面排期与已完成的访谈口径互证。
- **AI任务**：AI给判断 → 人要求考证 → AI检索证据**或被驳回**；存疑必标注“待补”；一手信源>二手报道。
- **产出 → 地图去向**：考证记录（每条关键结论挂双源）+局限清单（块4“待内部数据补全”项的来源）。
- **避坑**：AI的自信不等于证据；敢列局限本身就是方法论的一部分——写“此处受限于外部视角，需内部数据补全”，比硬编一个数字专业得多。

H40-48 · 成图与汇报


- **目标**：四块收敛，把个人认知变成团队可用的决策输入。
- **动作**：四块收敛为**一页认知地图**（中心放三问——做什么/为谁做/对手是谁，辐射四块要点）；与直属上级做一次15分钟同步【推演】：用一页认知地图讲清这48小时的判断（主体），收尾抛三个需上级拍板或给资源的问题——匹配舆情如何定级？新手漏斗数据从哪取？双轨优先级怎么排？（带判断和待拍板的问题去，不是带困惑去。）
- **AI任务**：AI做排版收敛与图形草稿，人定汇报取舍；汇报准备完成后，**让AI站在高1-2个层级反查**——“这页地图是否真实回答了三问？哪块证据最弱？”反查结论计入局限清单。
- **产出 → 地图去向**：一页认知地图+三问清单+反查记录。
- **避坑**：这次同步要的是决策输入，不是信息展览——带着判断和待拍板的问题去，比带着结论去更像一个清醒的新人PM。

SOP总原则

一手优先、双源交叉、敢列局限、AI做杠杆不做拐杖。

附·与 AI 工具交互的关键过程记录

下列为「快速认知构建」过程中与 AI 工具（Claude）协作的关键往来：人提出审稿意见与质疑、AI 给方案并在被指出问题时更正（误判官方角色、按玩家视角修正美术判断、统一竞品称呼等），体现「AI 出方案、人来拍板与校正」。

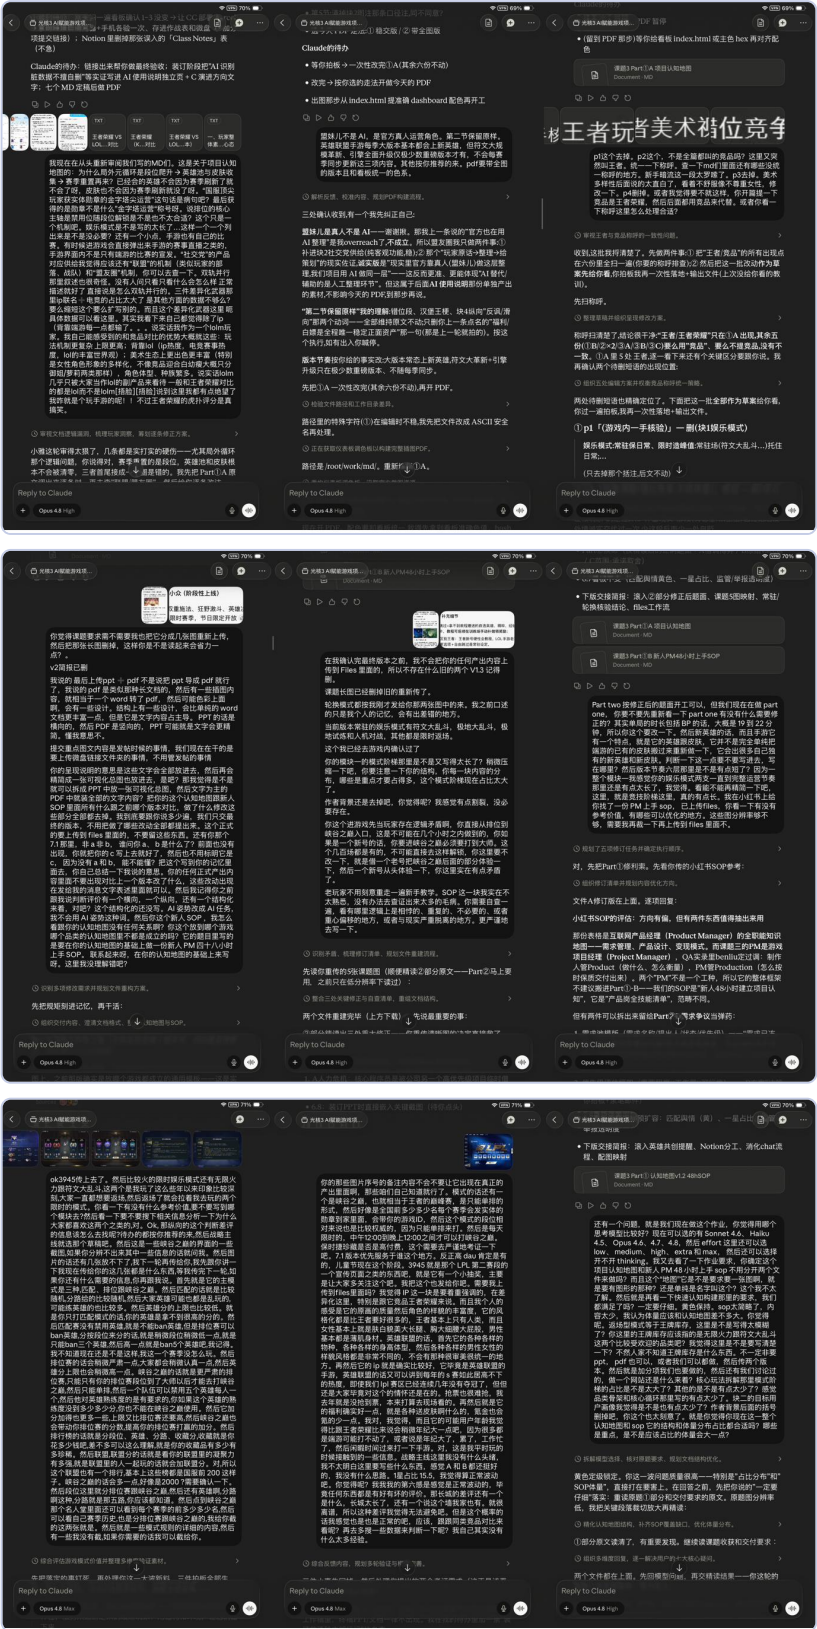

第二部分

冲刺管理 · 冲突决策与团队协作

Part② 冲突决策与团队协作

情境：7.1版本冲刺期，距提交还有3周，同时面对人力、需求、范围三个棘手状况。

处置次序先于处置方案：先分诊，资源一本账

同时面对不等于逐个救火，更不等于同时处理。三个状况本质是**同一个3周冲刺期里的三种资源争夺**——人力（A）、范围（B）、质量容量（C）——任何一案的解法都在花同一池资源，所以三案必须共用一本账。

按"紧急度×影响面"分诊处置次序：**A最先**——人员借调当天生效，知识转移的时间窗每拖一天关闭一天；**C紧随**——测试排期越早重排，损耗越小；**B程序化**——变更请求有标准流程承接，48小时内给出结论即可，不必当场争论。

状况A · 人力危机

团队核心程序员被公司另一个高优先级项目临时借调，所负责的功能面临延期风险。

决策结论：接受借调这一公司层级的优先级决策，但第一时间谈判借调条件——与借调方和共同上级敲定**书面归还时间表**；若人尚未到岗对方项目，争取尽可能长的交接窗口，集中完成最难模块的攻坚与知识转移；若人已转移，则改为争取借调首周每日固定30分钟远程答疑+关键模块的补充交接会议。同步**尽早确定**功能降范围（保核心体验，砍外围扩展项）而非留作备选——人力缺口使原范围按期交付的概率显著下降，下游测试容量又同样紧张（状况C），双重挤压之下，早一天定范围就多一天按新范围推进的余地；砍掉外围的代价，远小于范围悬而不决的代价。

决策依据：①借调是公司级决策，PM的职责不是对抗决策而是管理影响；②战略主线要求该功能的核心体验必须保住——降范围砍的是外围，不动主轴；③该功能属于本版本交付范围、与其他功能共享同一条测试管线——题面中测试团队的超载正是针对整个版本而言——因此降范围对状况C有顺向缓解，幅度取决于该功能测试量的占比，不宜高估，但方向为正；④交接与答疑安排越早敲定损耗越小——无论人走没走，每拖一天可转移的窗口就少一天，这是A在三个状况中最先处置的原因。

关键风险：归还时间表跳票（对策：上级书面确认、与里程碑挂钩）；留守程序员过载引发次生延期（对策：降范围落地+每日站会盯进度）；被借调者两头受压、隐性双倍工作（对策：明确其借调期间对本组的责任边界——只答疑、不背任务）。

涉及的沟通对象：借调方项目PM与双方共同上级（谈条件、要书面确认）；本组主程序与主策划（降范围共识）；被借调程序员本人（当面沟通交接安排与责任边界——人不是资源表上的数字）；QA负责人（同步测试范围变化）。

状况B · 需求争议

版本需求已冻结，策划同事拿着玩家社区的高呼声数据提出加一个新功能，团队内部意见分裂。

决策结论：不当场裁决"该不该加"，启动**48小时轻量变更评估**——评估工作量、测试影响、对冲刺承诺的挤占，并以当前盘面（人力已减一、测试容量已超载）为评估背景、门槛从严；预期结论为新功能进**需求池**（记录名称、提出人、数据支撑、优先级评估），下版本优先评审。同时协助策划把社区呼声补强为可量化的收益预估（预计拉动的DAU脉冲与回流），作为下版本立项的弹药。

决策依据：①需求冻结纪律的价值大于任何单个功能——冲刺期的冻结是对全团队交付承诺的保护；②"同时面对"的盘面让答案更清晰：人力已少一人（A）、测试已超载（C），此时扩范围等于三处失火再泼油，变更评估的挤占成本项必然爆表；③民意数据是决策输入、不是决策本身——声量能说明玩家想要什么，不能说明冲刺期该不该做；④用流程承接而非立场拒绝，保护提案积极性——下个版本的好功能，可能就来自这次被善待的需求池条目。

关键风险：错过热点窗口（对策：低成本的预热钩子可列为补丁期选项）；"冻结可议"的口子被撑大（对策：变更评估明确为例外流程并记录在案）；策划情绪与团队分裂（对策：评估会上让数据说话，纪要如实记录各方意见——被认真对待的反对意见不会变成怨气）。

涉及的沟通对象：主策划与提案策划（流程沟通+数据补强协作）；主程序（工作量评估输入）；QA负责人（测试影响输入）；运营（热点窗口判断）；直属上级（例外流程报备）。

状况C · 范围博弈

测试团队（QA）反馈测试工作量远超预期，建议砍掉一个运营侧已对外预告过的非核心功能。

决策结论：该功能**不砍、也不带病上线**——移出主版本，随字母补丁（版本上线后1-2周）推出；运营对外口径同步调整为"将于版本后续更新推出"，必要时配合福利发放对冲负面情绪；测试容量立即按风险分级重排，核心体验全量测试优先。

决策依据：①质量底线不可让——在口碑两极分化、匹配舆情已列黄色观察项的背景下，带病上线的代价远大于小幅延期；②"取消"与"延后"对玩家信任的伤害量级完全不同——字母补丁节奏（约1-2周一个）是版本结构里现成的泄洪道，让对外承诺从"跳票"降为"晚到"；③福利是经口碑验证的护城河资产，用它对冲延期情绪有蓝本依据；④与A联动：补丁期的开发与测试人力取决于借调归还时间表，C的排期必须按A的谈判结果核算——这也是A优先处置的另一重原因。

关键风险：二次跳票造成信誉双杀（对策：补丁排期按A的人力最坏情形核算、留出缓冲）；补丁期资源被占、挤压后续迭代（对策：移期功能范围锁死，不顺手加料）；对外改口的执行成本（对策：统一话术、上级背书后再发布）。

涉及的沟通对象：QA负责人（重排测试优先级、确认补丁期容量）；运营负责人（对外口径与福利方案）；主策划（功能移期的体验影响评估）；直属上级（对外承诺变更需其背书）；社区与客服一线（统一答疑话术）。

三案咬合：一个冲刺方案，而非三个孤立决定

A减人则降范围，省下的开发量同步为C的测试容量泄压；B守住冻结，不给本已紧绷的盘面增加新变量；C延后错峰，把交付压力疏导进补丁节奏，而其排期又以A谈回的人力时间表为前提。三个决策共用一本资源账、一把裁判尺（战略主线：保住成熟玩家的信任与体验）、一条底线（口碑敏感期，质量与信任优先）。同时面对三件棘手事的答案，不是三次各自聪明的应对，而是一个自治的冲刺方案。

Part② 沟通件：需求变更评估会 会议纪要

会议名称：7.1版本需求变更评估会（玩家社区高呼声功能提案）

时间：冲刺期第1周 周四 14:00-14:45 | **形式：**线上会议

主持/记录：项目经理 | **参会：**主策划、提案策划、主程序、QA负责人、运营代表

会议背景：版本需求已冻结，距提交3周。策划组基于玩家社区高呼声数据提出新增功能提案，团队内部意见分歧。按变更管理例外流程，召开本次轻量评估会，目标是在48小时评估窗口内给出明确结论，避免议而不决消耗冲刺期。

一、提案陈述（提案策划）

功能提案基于玩家社区持续的高呼声：相关话题在社区的讨论热度与点赞量处于近期高位，玩家诉求集中且明确。提案策划认为该功能上线可直接回应社区期待，对版本口碑与活跃度有正向拉动，且热点窗口存在时效性——版本期是声量最高的承接时机。

会议确认：**提案所反映的玩家诉求真实、数据扎实，提案本身体现了对玩家社区的敏锐关注。**

二、评估输入

- **主程序（工作量）：**按提案范围估算，需要额外投入相当一部分开发工作量；核心程序员被借调后，组内开发余量已全部用于保障既有承诺范围，无力承接新增。
- **QA负责人（测试影响）：**版本总测试工作量已超出原排期预估，正在与项目经理重排优先级；新增功能将进一步扩大缺口，无法在现有窗口内保障测试质量。
- **运营代表（窗口判断）：**社区热度短期内不会消退，该类诉求属长期持续型呼声而非一次性热点；版本期之后承接，声量损耗有限。

三、讨论要点

- 支持纳入的观点：玩家呼声是难得的"需求确定性"，错过版本窗口可能被解读为官方迟钝；
- 审慎观点：需求冻结是冲刺期对全团队交付承诺的保护，当前人力与测试容量双紧的盘面下，扩范围将威胁既有承诺的交付质量；
- 双方共识：分歧不在"该不该做这个功能"，而在"该不该在这个版本做"——功能价值本身无人否定。

四、会议结论

1. **本版本不纳入该功能**。依据为本次评估的三项输入：开发余量不足、测试容量已超载、热点窗口经运营判断可延后承接——是冲刺期约束下的排期决策，**不是对功能价值的否定**。
2. **功能即日登记入需求池**（含提案说明、社区数据、本次评估记录），列为**下版本评审的最高优先级条目**。
3. 项目经理与提案策划共同完成数据补强：将社区呼声转化为可量化的收益预估（预期拉动的活跃与回流），作为下版本立项依据。
4. 低成本预热钩子（预告类内容）列为版本后补丁期的可选项，由运营评估后另行决议。

五、行动项

事项	负责人	时限
功能登记入需求池（含完整提案与评估记录）	项目经理	即日
社区数据→量化收益预估的补强	提案策划+项目经理	一周内
预热钩子的可行性评估	运营代表	补丁期排期前
下版本需求评审会上该条目优先过会	主策划	下版本规划启动时

备注：本次评估自提案提出至结论产出共计两个工作日，全程记录在案。感谢提案策划对玩家社区的持续关注与数据准备——冲刺期的纪律与对玩家声音的尊重并不冲突，需求池里的这一条，是下个版本最有玩家缘的起点之一。

纪要发送范围：全体参会人、直属上级（例外流程报备）。

第三部分

复盘规划

Part③-A 版本复盘框架

情境：版本上线，DAU达到预期目标的85%，玩家口碑两极分化（核心玩家认可、新手劝退），团队经冲刺期高压，士气有所下降。

复盘原则：对事不对人——复盘的对象是决策与流程，不是个人表现；数据先行——判断尽量挂数据或证据，体感单独标注；产出可落地的行动项——比起开得隆重，更要让讨论转化成下一步真做的事；轻量优先——复盘为改进而非仪式，能简则简，看不到切实产出就不必占用大家工时。

四个复盘维度

维度1 · 目标与结果：85%是怎么构成的 - 核心问题：DAU缺口的15%发生在哪一环——新增不及预期、新手留存流失、还是回流未接住？按"新增→留存→回流"做归因树拆解，定位主要缺口环节。 - 关键数据：DAU/MAU、分渠道新增、次留/7留/30留、回流用户数、新手漏斗（教学完成率→首胜→第10局留存）。 - 牵头角色：数据分析。

维度2 · 体验与口碑：分化的两端分别在说什么 - 核心问题：核心玩家认可的是什么（保住它）；新手在漏斗的哪一级流失、流失原因是认知门槛还是体验问题；匹配舆情在版本期内的走势如何。 - 关键数据：外部口碑三维定位（横向同平台对比、纵向版本前后切片、结构归簇）、新手漏斗分级数据、客服工单与举报分类、风险看板的舆情指标走势。 - 牵头角色：运营+数据分析。

维度3 · 过程与协作：冲刺期的决策回看与团队状态 - 核心问题：冲刺期三项关键决策（人力借调应对、需求冻结的变更处理、功能延后随补丁上线）各自的执行结果如何——决策本身对不对、执行到不到位、当时缺什么信息；团队负荷曲线如何，士气下降的具体来源是什么（加班强度、目标不清、决策反复、还是付出未被看见）。 - 关键数据：里程碑达成记录、借调归还时间表兑现情况与远程答疑记录、结对开发运行情况、变更记录与需求池台账、补丁执行情况、加班与排期数据、匿名士气问卷+一对一访谈摘要。 - 牵头角色：PM（决策回看）+各职能负责人（团队状态）。

维度4 · 商业与质量：双轨的成绩单与质量底线 - 核心问题：高付费线与高DAU线各自达成情况（双轨并行的判断是否被结果验证）；线上事故与热修次数；测试容量问题是否复发。 - 关键数据：付费率/ARPPU、活动参与率、限免领取与转化、事故清单与热修记录、测试覆盖率。 - 牵头角色：运营（商业）+QA负责人（质量）。

参与角色与职责分工

角色	复盘中的职责
制作人	列席关键结论环节，做战略级争议的最终拍板（不必全程参与细节讨论）
项目经理（主持）	全程主持、维度3决策回看主讲、行动项收口与后续跟踪
数据分析	复盘数据包制作、会中归因的数据支持
主策划	体验与设计侧归因（维度2）
主程序	技术债盘点、研发效率与单点风险回看
QA负责人	质量事件与测试容量复盘（维度4）
运营	口碑走势与商业线复盘（维度2、4）
美术负责人	内容产能与排期匹配度回看

核心参与者是与本版本直接相关的角色；非直接相关者按议题列席即可，不强求全程全员，避免无效占用工时。

会议安排（三段式）

会前：数据分析牵头出一份精简"复盘数据包"（每维度一页：数据结论+关键图表+待讨论的开放问题），提前发给参会人；时间紧的话会上花十分钟快速过也行，不强求人人预习——目的是让讨论有共同的事实基础，而不是布置作业。团队士气不另搞全套调研，借助团队已有的定期一对一沟通渠道收集即可；若想要更结构化的信号，可附一份五分钟内能填完的匿名小问卷，会上只看汇总、不溯源到人。

复盘会（约2小时，项目经理主持）：对一个版本周期的复盘，行业常见时长在1.5-3小时之间，2小时是务实区间。四个维度各约25分钟（数据结论→归因讨论→当场记下改进想法），最后20分钟把想法收敛成行动项。主持规则：先看数据再下结论；对事不对人、批评指向流程而非个人，给足安全感；想法尽量具体化，能落到"下一步做什么"才算数；一时谈不拢的挂入"待议清单"会后处理，不拖垮主进程。

会后：项目经理把行动项整理出来，每项尽量明确负责人和目标时间，避免议而不决；决议公示（如贴在团队看板上），下个周期的站会与下次复盘开场回看进度。行动项不在多，在于真的被跟进。

数据来源（按类别与准备人）

- **内部报表**（数据分析备）：DAU/MAU、分渠道新增、留存、付费/ARPPU、新手漏斗、模式参与分布；
- **过程资产**（项目经理备）：里程碑达成记录、需求池与变更台账、补丁执行记录、借调归还与交接记录、加班与排期数据；
- **工具沉淀**（项目经理备）：风险看板版本各指标走势导出（匹配舆情、一星占比、举报/监管透明度）；
- **人的声音**（各职能负责人分头收集）：匿名士气问卷汇总、一对一访谈摘要、客服工单与举报分类；
- **外部口碑**（运营备）：三平台评分快照+版本前后纵向切片。

输出物

- **行动项清单**：每项尽量包含事项、负责人、目标时间、关联维度——重点是可跟进，而非凑齐字段；
- **知识库条目**：决策类经验按“背景—决策—结果—复用建议”四段归档，供下个版本冲刺期直接调用（本版本三项冲刺决策为首批入库条目）；
- **士气专项跟进**：问卷与访谈中浮出的问题列入月度跟踪，明确每项的责任负责人；
- **复盘会纪要**：会议当日发出，发送范围为全体参会人，存档项目知识库。

Part③-B 未来3个月版本Roadmap

定位：本Roadmap站在版本复盘结论之上——复盘定位的问题（DAU缺口环节、口碑分化两端、冲刺期负荷）即规划的优先级来源。**排序逻辑**：以战略主线为裁判尺，保住成熟玩家的信任与体验优先；两条必答主线贯穿三个月——**口碑分化**（新手侧修漏斗、核心侧修匹配信任）与**团队士气**（节奏先降后升、让团队做被玩家叫好的事）。

M1（上线后第1个月）· 稳住与还债

- **里程碑节点**：月中——新手漏斗埋点与归因报告完成；月末——匹配/ELO满意度专项归因立项评审。
- **核心交付物**：①新手体验专项启动（教学漏斗逐级埋点、流失归因、首批优化项排期）；②匹配/ELO体验专项归因立项——该问题在入职认知地图中已被列为版本健康度的黄色重点观察项、口碑结构中最集中的痛点，此处承接为正式的改进归因（区分真实机制问题与社区话术惯性）；③技术债清理与补丁收尾——冲刺期延后功能交付闭环后，跟踪其上线舆情，验证“晚到优于取消”的判断是否成立；④借调收尾——按书面归还时间表确认人员回归节点，回归后完成反向交接（借调期间的代码变更与决策同步），关键模块结对延续至交接完成；⑤团队恢复安排——本月不排除大型新需求、主动放缓节奏给团队喘息，版本庆功+复盘会落地，按公司机制安排冲刺期的调休。
- **风险预案**：借调后遗症（关键模块单点风险→结对+文档化双保险）；新手优化项与日常运营抢资源（→优化项分批，首批只做埋点验证过的高流失点）。
- **主线回应**：口碑分化——两端同时立项（新手漏斗+匹配归因）；团队士气——刻意降速+仪式感+还人情债。

M2（第2个月）· 内容上量与回馈

- **里程碑节点**：月中——需求池高优条目（冲刺期被冻结的玩家高呼声功能）正式评审上线；月末——新手优化首批改动上线并复测漏斗。
- **核心交付物**：①需求池兑现——冲刺期用流程接住的玩家呼声功能，此时携完整评估落地，给提案策划和社区一个交代；②内容供给恢复强度——手游原创皮肤线与高热度轮换模式返场节点（拉DAU脉冲与回流）；③新手优化首批上线+漏斗复测（用数据验证改动有效性）；④匹配归因的阶段结论与对策评审。

- **风险预案：**内容强度恢复过快复燃士气问题（→排期保留缓冲，加班数据纳入周会监控）；新手改动无效（→预设第二批候选项，不押注单点）。
- **主线回应：**口碑分化——新手改动见数据、匹配归因出结论；团队士气——做被玩家叫好的事本身就是士气资产，需求池兑现让冲刺期的克制有了下文。

M3（第3个月）· 新赛季节点与跃升

- **里程碑节点：**月中——新赛季版本内容锁定（冻结纪律沿用，变更走需求池）；月末——新赛季上线。
- **核心交付物：**①新赛季版本（赛季更替是品类天然的大节点：段位重置拉回流、赛季奖励拉活跃）；②匹配侧改动随新赛季落地（若归因支持），并配公告说明——对最大差评簇给出可见的官方响应；③电竞节点联动（赛事周期与版本节奏互相导流）；④复盘机制固化——版本复盘框架沉淀为版本标配流程。
- **风险预案：**赛季冲刺重演高压（→以M1的负荷数据为基线设排期红线，冻结纪律与变更流程已是现成工具）；匹配改动引发新争议（→灰度发布+舆情看板阈值监控+回滚预案）。
- **主线回应：**口碑分化——对匹配这一最大痛点给出公开响应，是修复“核心玩家信任”的最重一手；团队士气——用制度（排期红线、变更流程、复盘标配）防止冲刺期问题复发，让M1的承诺变成机制而不是一次性安抚。

三个月主线收束

新手漏斗（M1立项→M2见效→M3常态化）与匹配信任（M1归因→M2结论→M3公开响应）两条线贯穿始终，回应口碑分化；节奏曲线（M1降速还债→M2恢复强度→M3制度化防复发）回应团队士气。Roadmap的每一步都站在复盘结论之上——这正是复盘的意义：让下一个三个月不必重复上一个三周的代价。

Part③-C 开放题：优秀的项目经理与优秀的制作人，最本质的区别是什么

优秀的项目经理和优秀的制作人，本质区别在于：一个对“该做什么”负责，一个对“怎么做成”负责。

制作人负责产品本身——拆解目标、定义什么才算成功、规划通往成功的路径，并为最终成败兜底。他的核心是判断与取舍：在无数可做的方向里，决定哪个值得做、什么不该做。优秀的制作人，赢在方向感与品味。

项目经理负责交付过程——承接已定的目标，靠节点把控、风险预判和管线组织，把它按时按质做出来。他常常没有命令所有人的职权，却要靠沟通、信任和全局把控，让事情真的发生。优秀的项目经理，赢在落地力与推动力。

所以制作人向上看价值与方向，项目经理向下看交付与协作。但这条分界并非铁壁，它会随项目阶段和团队结构移动；而一个项目经理成长为制作人，最需要补上的，正是从“把事做对”到“判断什么才是对的事”那一跃。
